

11. Ажил гүйцэтгэх үе шатны төлөвлөгөө


Нарны цахилгаан үүсгүүрийн үе шатны төлөвлөгөө, ажиллах хүчний нөөцийг өмнө нь угсарч суурилуулсан төслүүдийн ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, хэрэгжилтэд үндэслэн боловсруулав. Үе шатны төлөвлөгөө нь дараах 5 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

- Тусгай зөвшөөрөл авах
- Ажлын зураг төсөл боловсруулах, батлуулах
- Тоног төхөөрөмж, бараа материалын худалдан авалт хийх
- Нарны цахилгаан үүсгүүрийн угсралт, суурилуулалт хийх
- Туршилт тохируулга хийх, ашиглалтад оруулах

Үе шатны төлөвлөгөөгөөр нэг байршлын НЦҮ-ийн төслийг цогц хэрэгжүүлэн ашиглалтад оруулахад бараа материал худалдан авалт хийх, зураг төсөл боловсруулах, батлуулах, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга хийх инженер техникийн 3 баг ажиллана.

Нарны цахилгаан үүсгүүр суурилуулахын тулд нэн тэргүүнд холбогдох байгууллагаас эх үүсгүүр суурилуулах техникийн нөхцөл авч зураг төсөл боловсруулах эрх бүхий байгууллагад өгнө. Зураг төслийн байгууллага захиалагчийн үндсэн мэдээлэл, өгөгдөл, техникийн нөхцөлд тулгуурлаан холбогдох норм дүрмийн дагуу ажлын зураг боловсруулан батлуулж, захиалагчид хүлээлгэн өгнө. Дараагийн үе шатанд нарны цахилгаан үүсгүүр суурилуулах эрх бүхий байгууллага ажлын зурагт тусгагдсан бараа материалын жагсаалтад үндэслэн худалдан авалт хийж, угсралт суурилуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн угсралт суурилуулалтыг ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэж, туршиж тохируулна. Угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулгын ажлыг бүрэн дуусгаж холбогдох байгууллагаар хянан шалгуулж, ашиглалтад оруулан эзэмшигчид хүлээлгэн өгснөөр нарны цахилгаан үүсгүүрийн худалдан авалт, зураг төсөл, угсралт суурилуулалтын ажил бүрэн дууссан гэж үзнэ.

Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа нь үүсгүүрийн хүчин чадлаас хамаарах бөгөөд нэг байршлын хувьд 110-135 хоногт, 11-15 хүний баг бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэнэ.

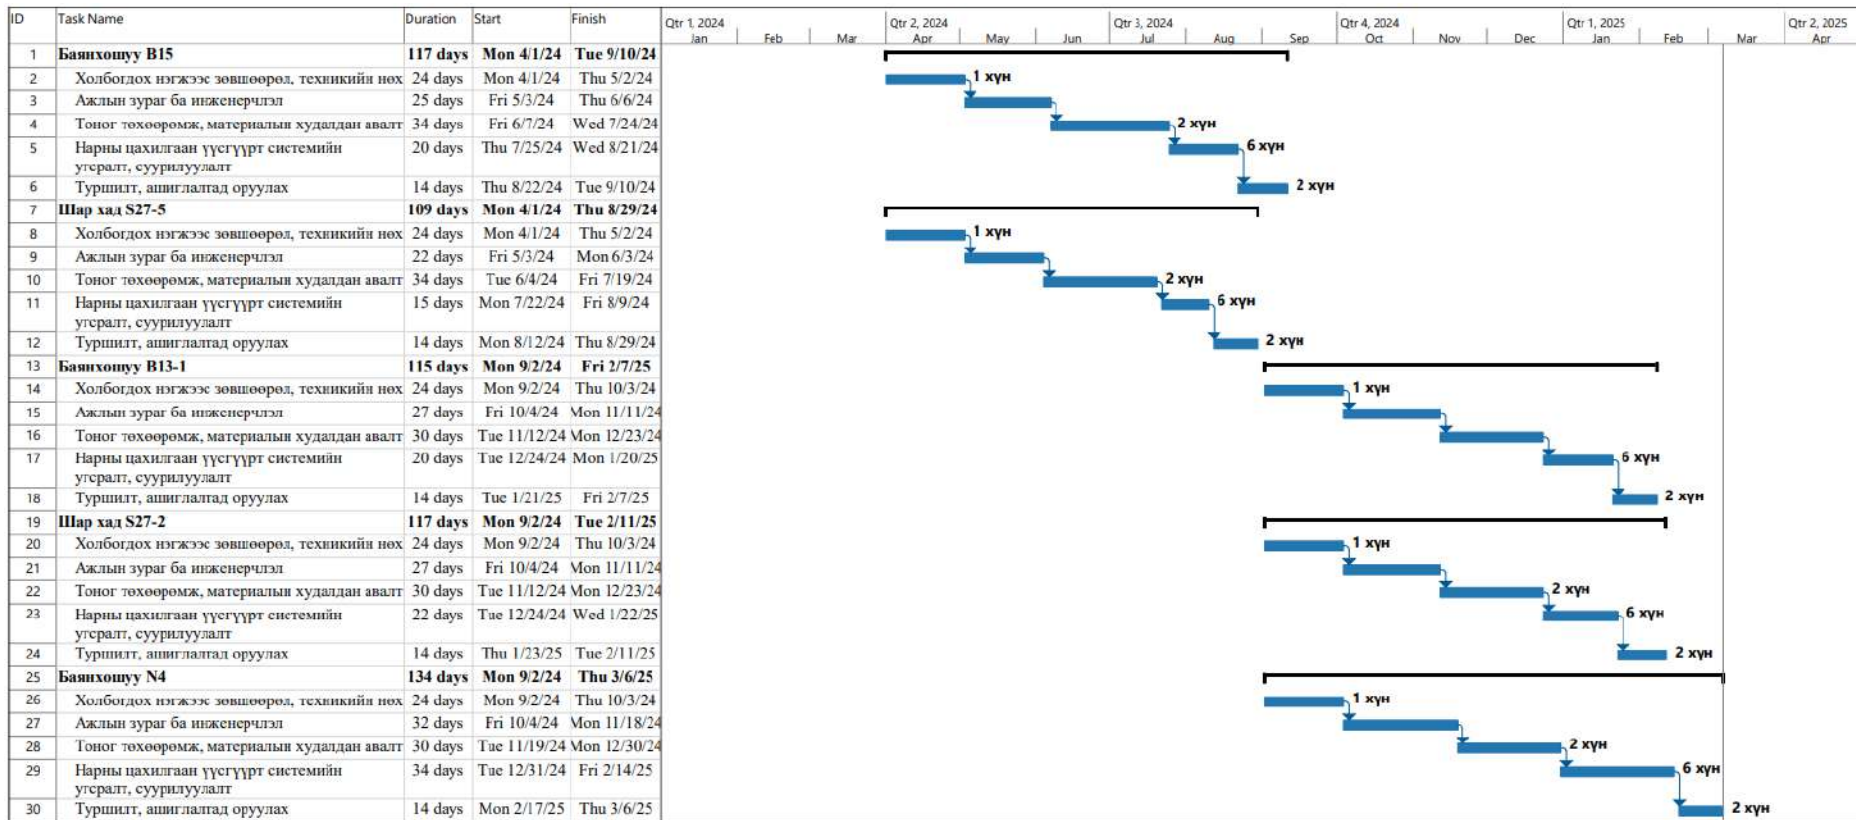

Зураг 103 Ажил гүйцэтгэх үе шатны төлөвлөгөө
